

Réunion EPCI




Confluent et Coteaux de Prayssas

25 janvier 2021, 14 h



La répartition des zones Très Haut Débit en France

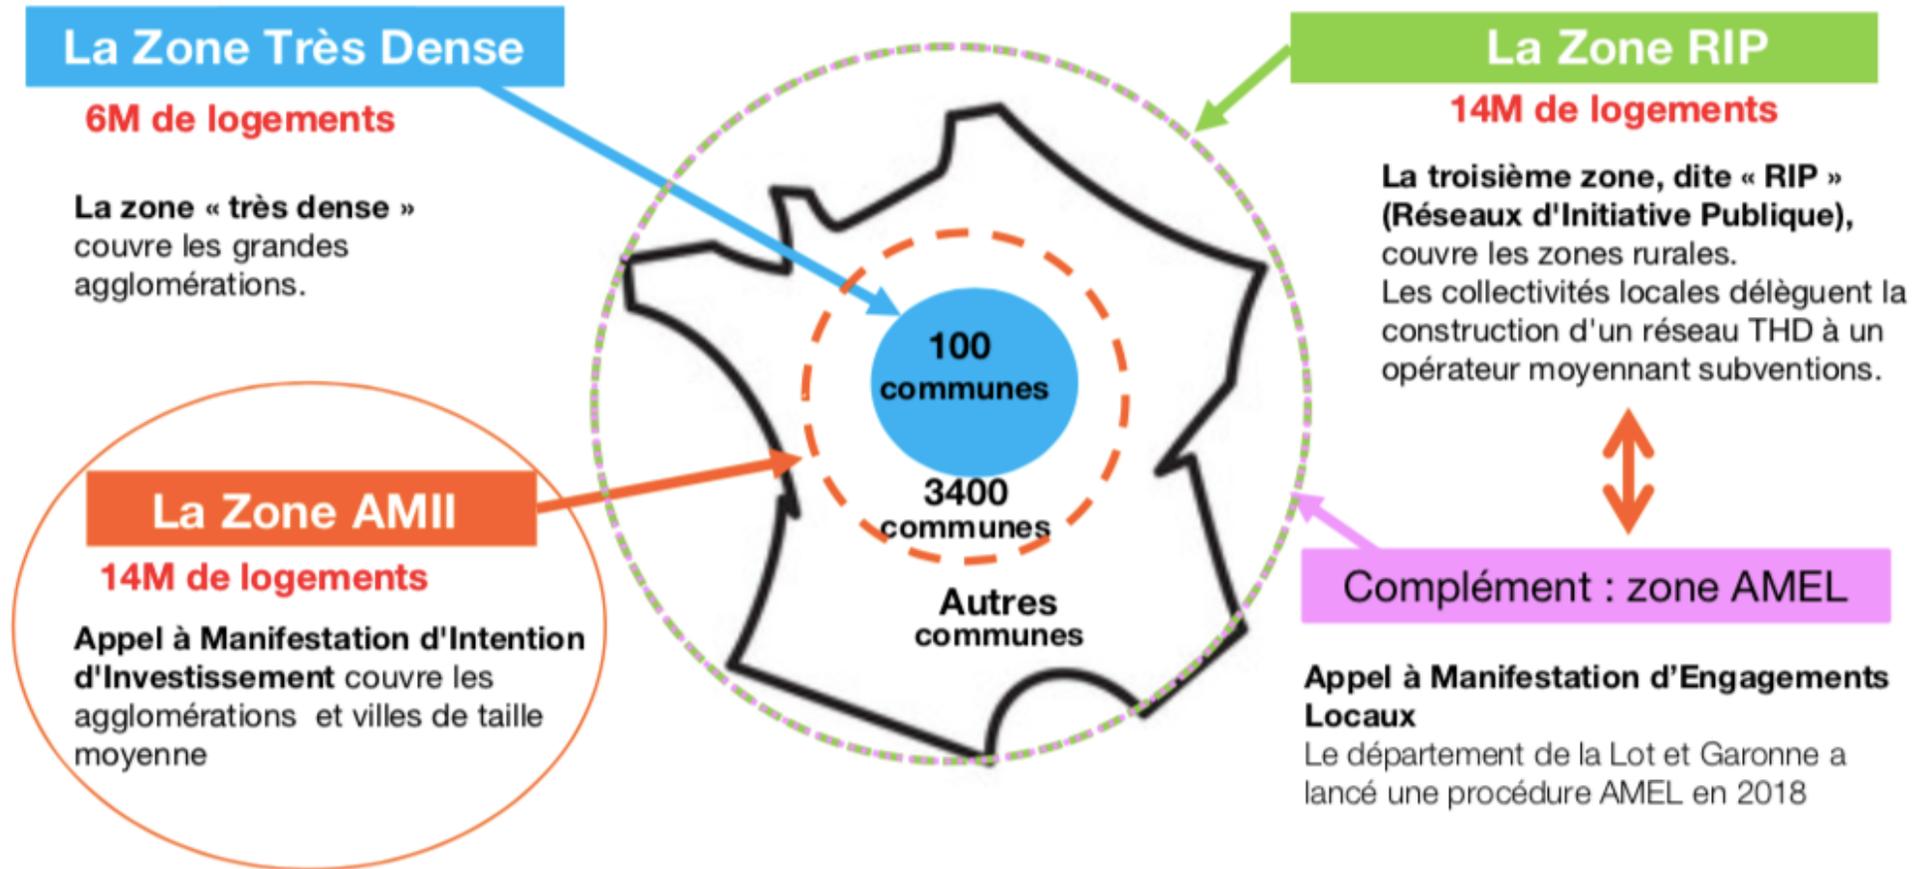

Les grandes phases de déploiement


Projet révisé suite AMEL

Schéma initial (2011):

déploiement 100% public (hors AMII)

Objectif : en 10 ans, coût de 200 M€

Travaux démarrés en 2018

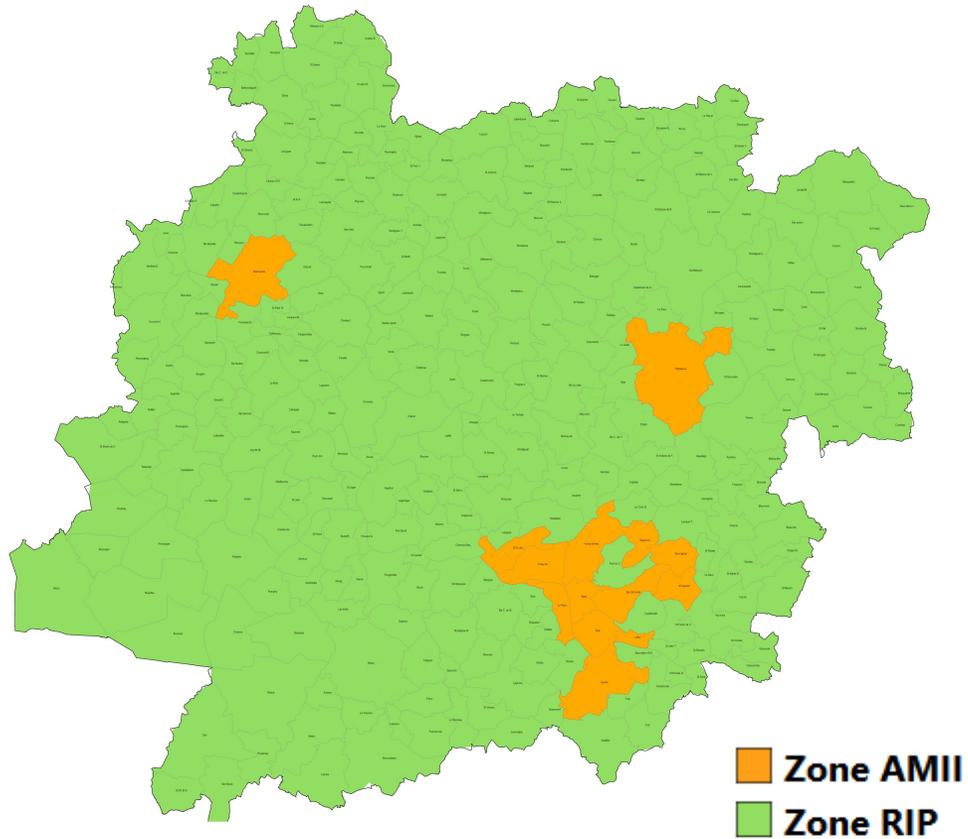


Révision AMEL (2019)

Partenariat avec Orange

Objectif : 100% d'ici fin 2023

Deux fois plus vite, deux fois moins cher pour les collectivités

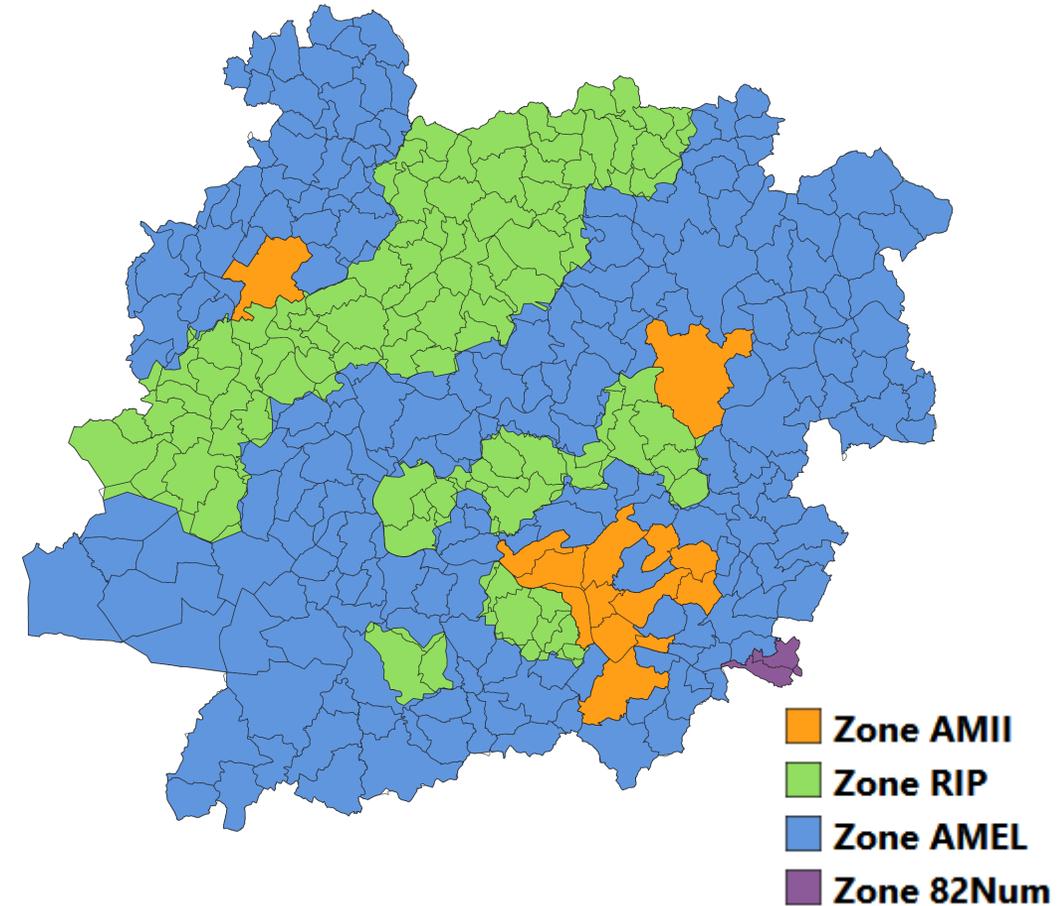

Financement du projet

Un investissement public de 85 M€ :


- Collecte : 7,5 M€
- Transport + distribution : 65 M€
- Raccordement : 10 M€
- Autres : 2 M€

Des charges de fonctionnement

- Location des infrastructures d'Orange
- Emprunts
- RODP

Participation de Confluent Coteaux de Prayssas

- 170 000 € sur 5 ans

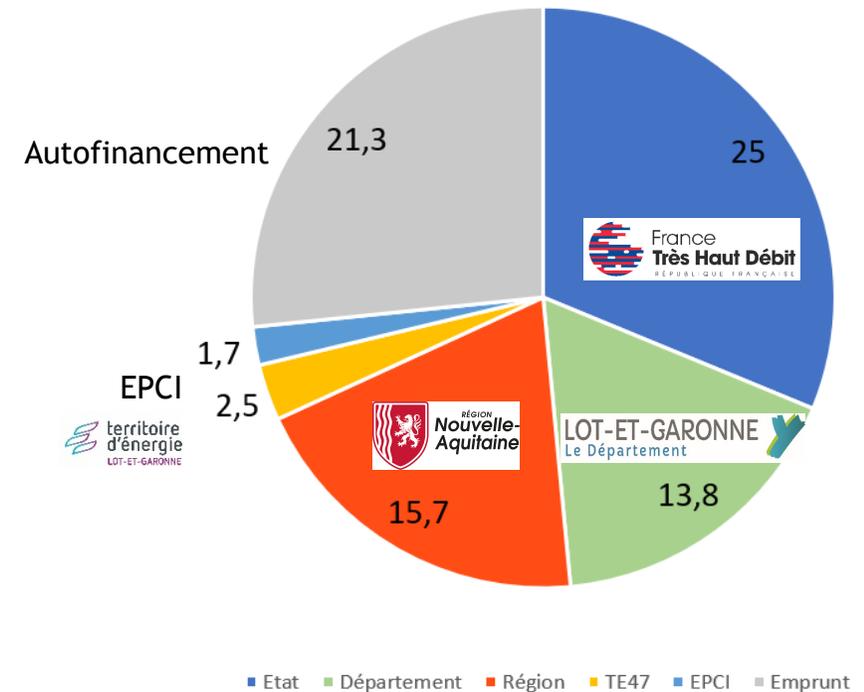


Les grandes phases de déploiement

Objectif 100 % Fibre en cinq ans (2023)

Grâce à l'accord conclu avec Orange en 2018


Validé par le Gouvernement le 20 mai 2019

Déploiement de la fibre optique - planification

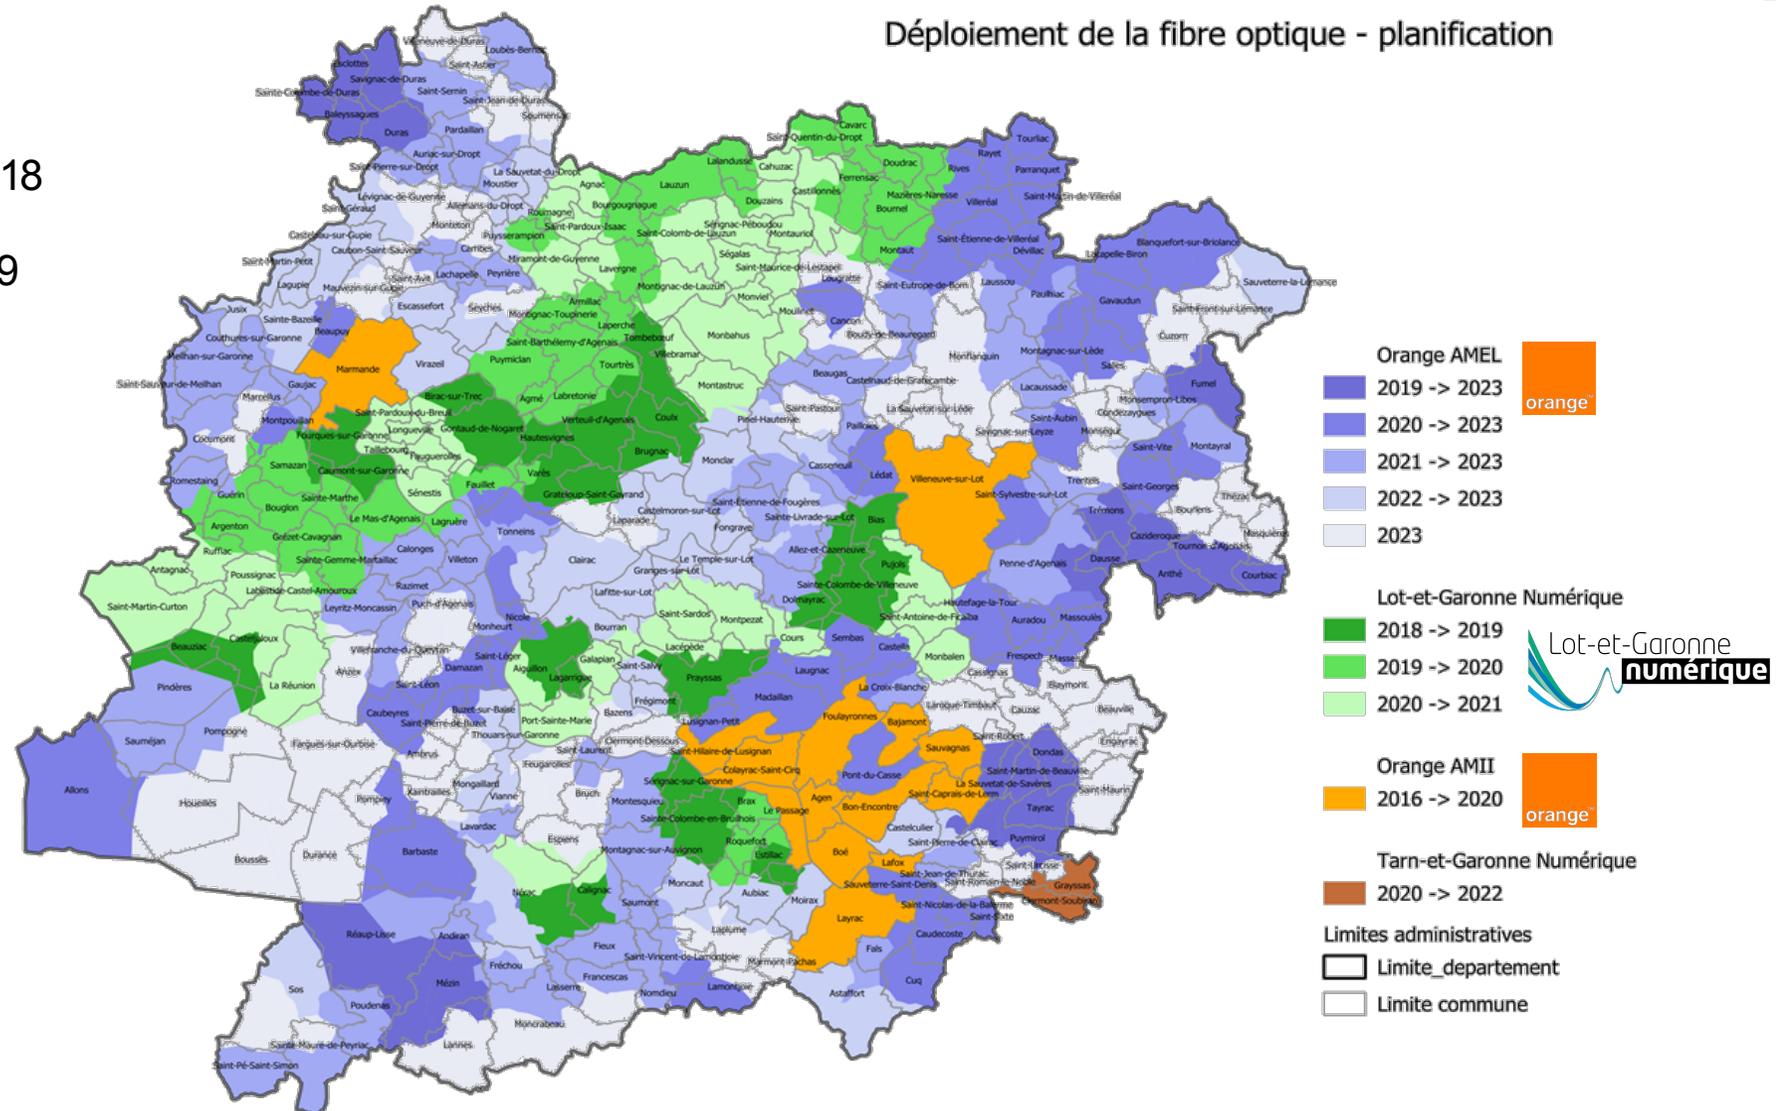

Avancement du déploiement

-  Limites EPCI
-  Communes
- Où en est-on ?
-  Commercialisation
-  Fin de travaux commercialisation prochaine
-  Travaux
-  Etudes
-  Début des travaux en 2022
-  Début des travaux en 2023

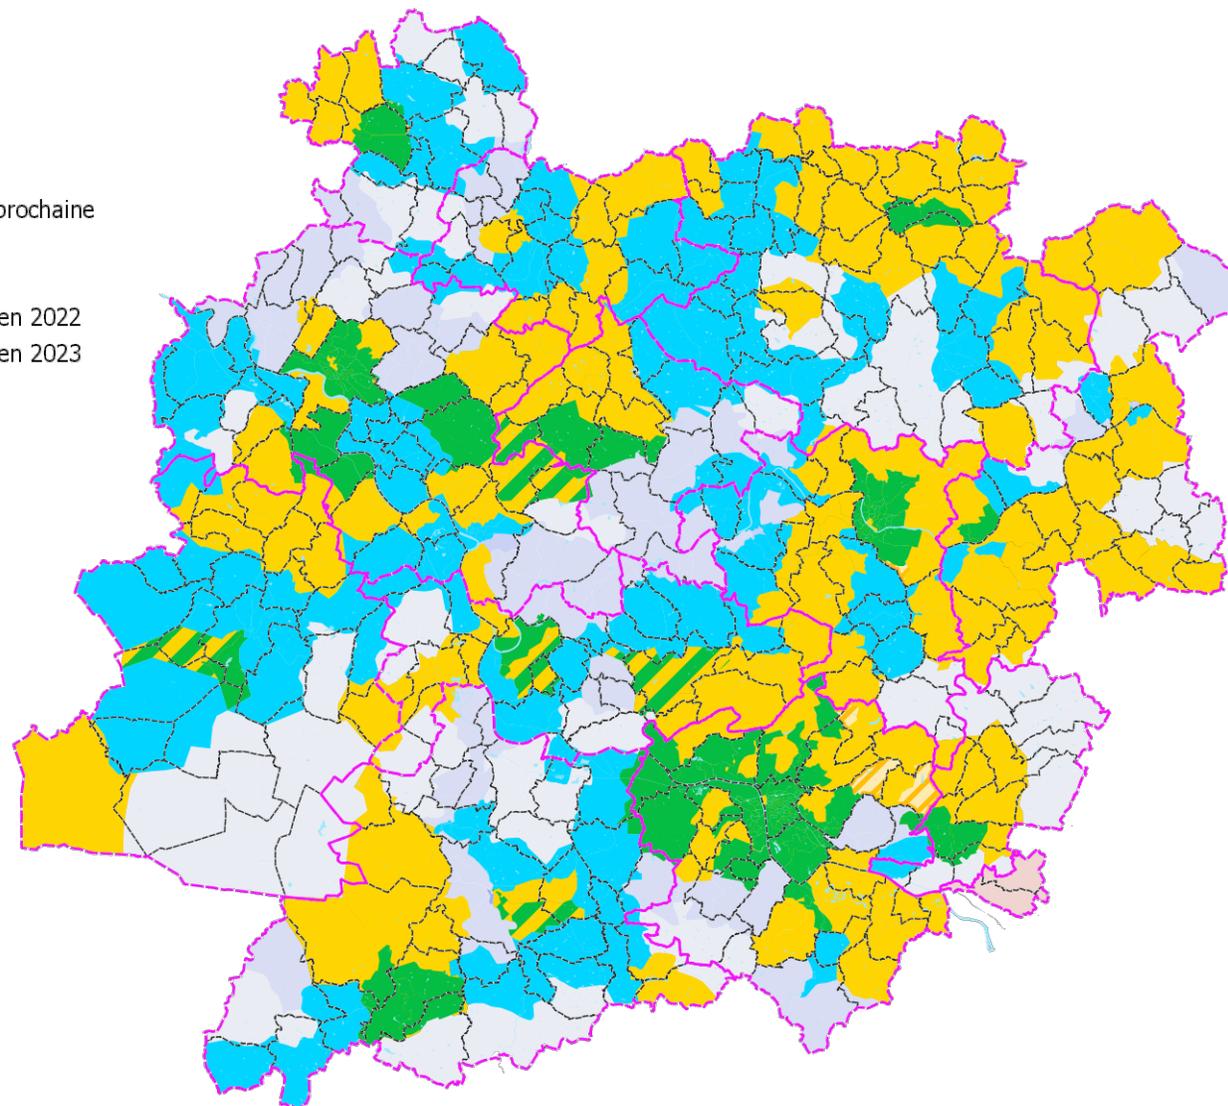


Volumes prévisionnels de déploiements

Volumes annuels de déploiements / Zones	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zone AMII (Agglomération d'Agen et communes de Villeneuve sur Lot et Marmande)	2 632	8 030	16 030	31 966	53 509	58 645	62 952	62 952
Zone Réseau d'Initiative Publique (RIP) (construit par Lot-et-Garonne Numérique)			1 000	9 777	22 500	36 000	44 000	44 000
Zone AMEL Orange (sous contrôle du Syndicat Lot-et-Garonne Numérique)					21 000	47 000	73 000	103 000
Total cumulé	2 632	8 030	17 030	41 743	97 009	141 645	179 952	209 952
Proportion	1,3%	3,8%	8,1%	19,9%	46,2%	67,5%	85,7%	100,0%

Volumes prévisionnels hors crise sanitaire


Zoom sur Confluent et Coteaux de Prayssas

Les grandes phases de déploiement

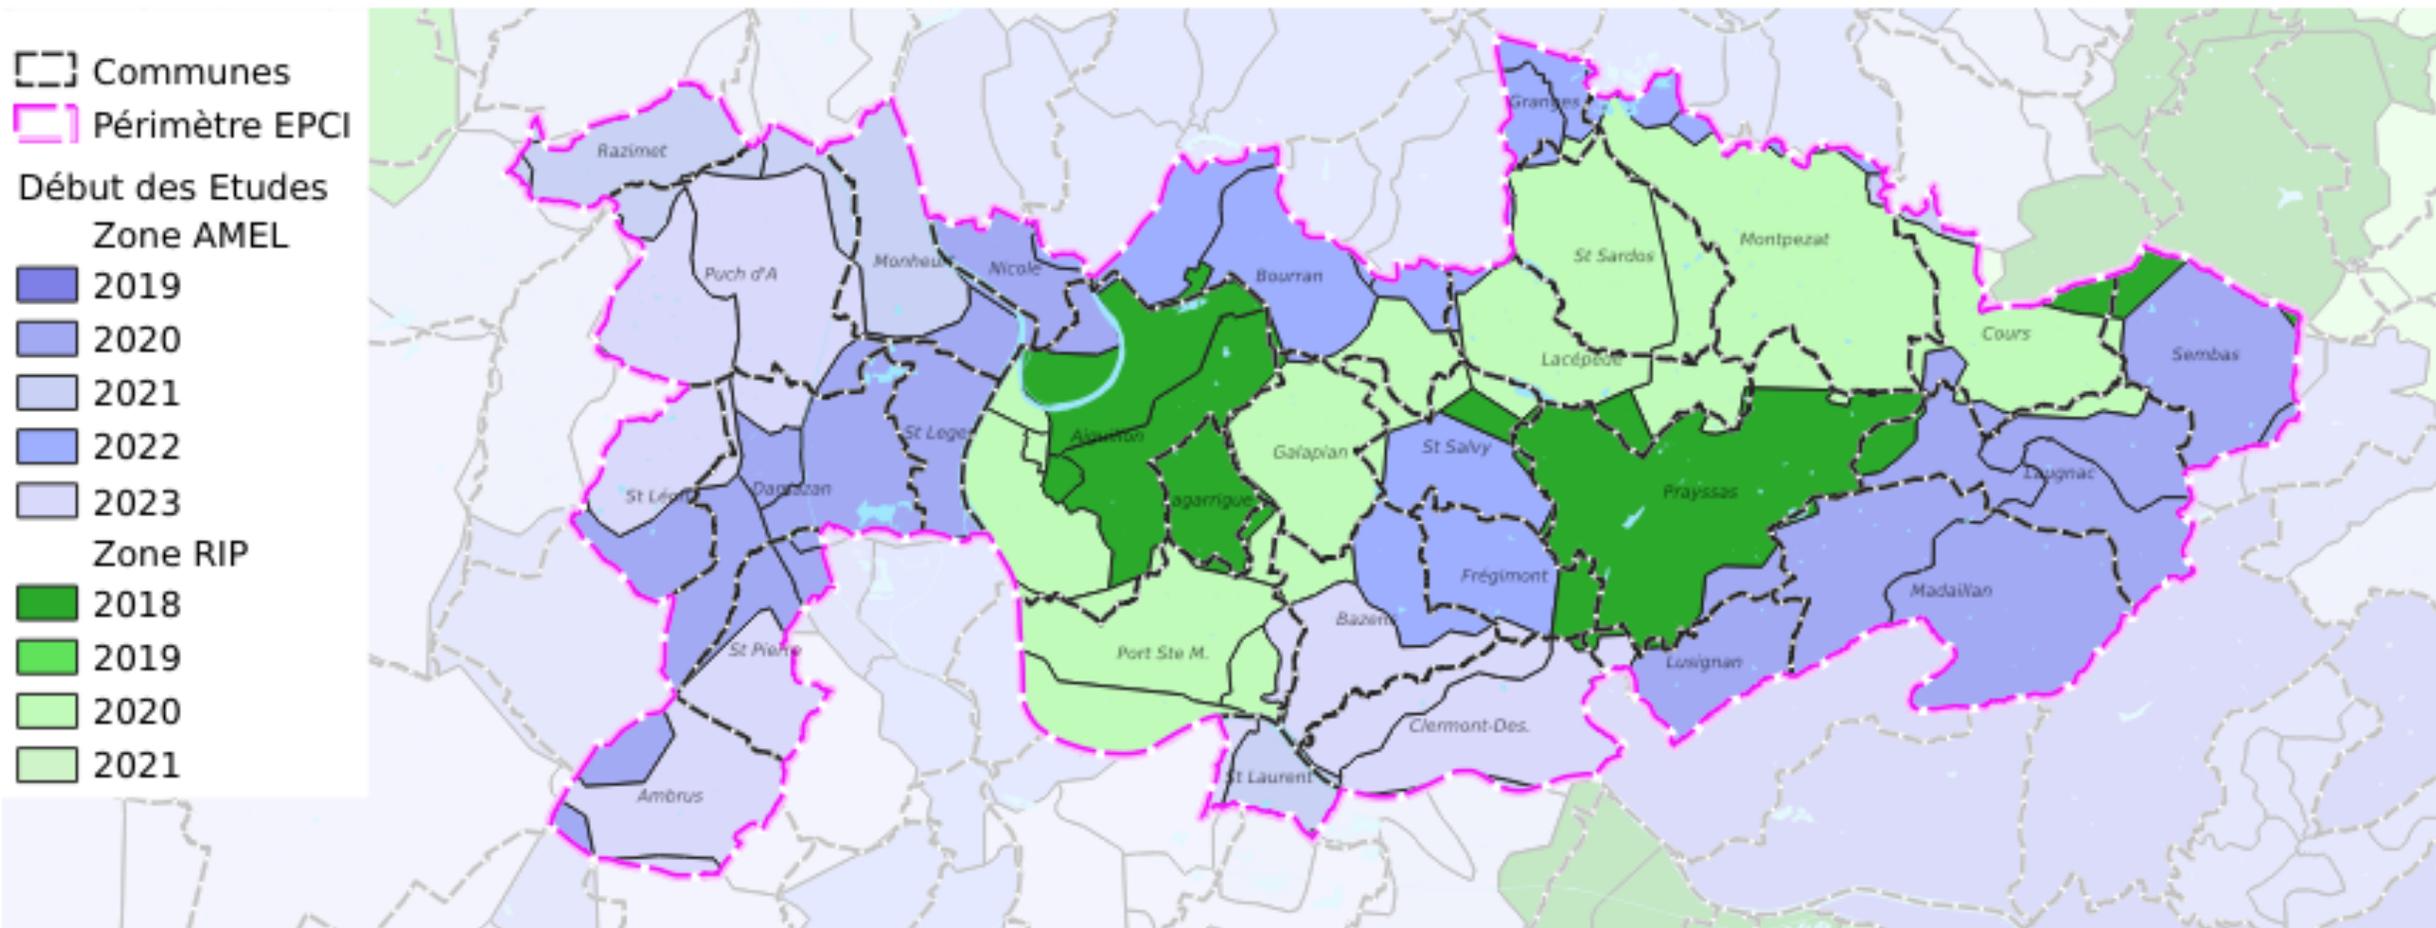

Avancement du déploiement

- Limites EPCI
- Communes
- Où en est-on ?
- Commercialisation
- Fin de travaux commercialisation prochaine
- Travaux
- Etudes
- Début des travaux en 2022
- Début des travaux en 2023

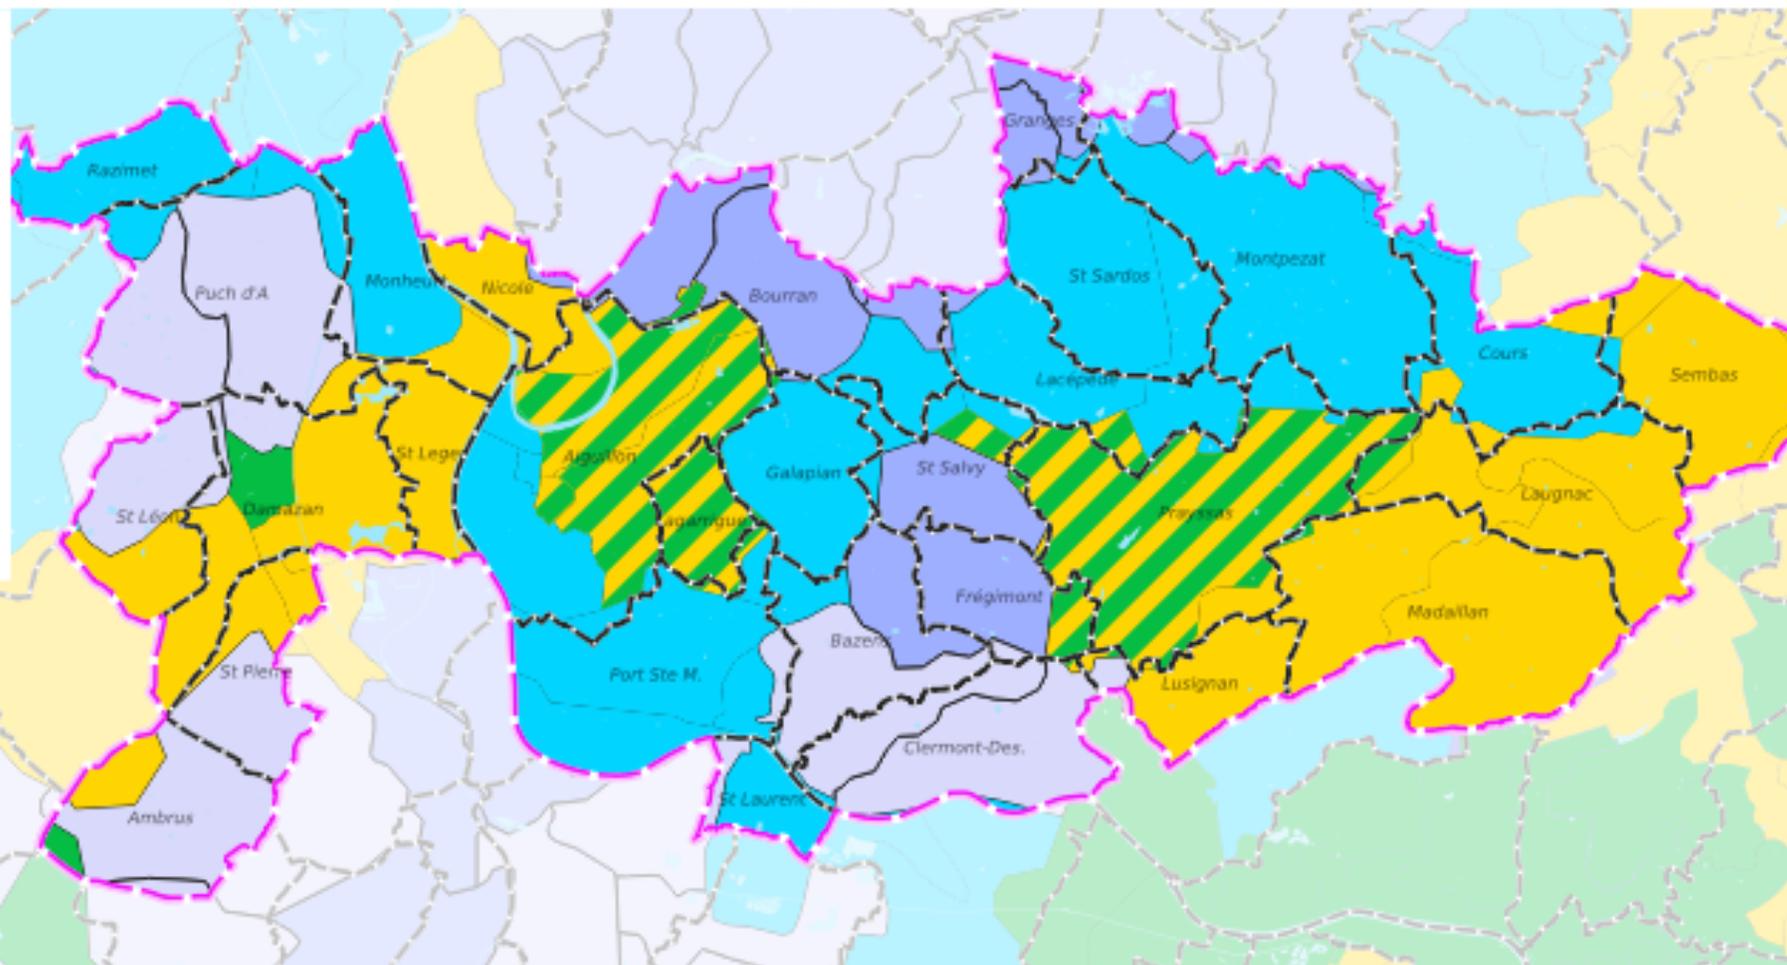

Avancement du projet

Zone RIP – 6 000 foyers

- Trois plaques et 1300 foyers ouvrent au premier trimestre
 - Aiguillon Prayssas
- Aiguillon-Lagarrigue fin avril - 500 locaux

Zone AMEL – ~5 000 foyers

- Les premières commercialisations ont débuté en tout début d'année
 - Une centaine de locaux du Damazan
- Les études du programme 2020 sont achevées
- Les travaux de ce programme commencent
 - Damazan, Saint Leger, St Léon, St Pierre de Buzet, Nicole,
 - Laugnac, Sembas
 - Et bientôt Madaillan et Lusignan-Petit

Ouvertures commerciales

Limites EPCI

Communes

Où en est-on ?

Commercialisation

Fin de travaux


commercialisation prochaine

Travaux

Etudes

Début des travaux en 2022

Début des travaux en 2023

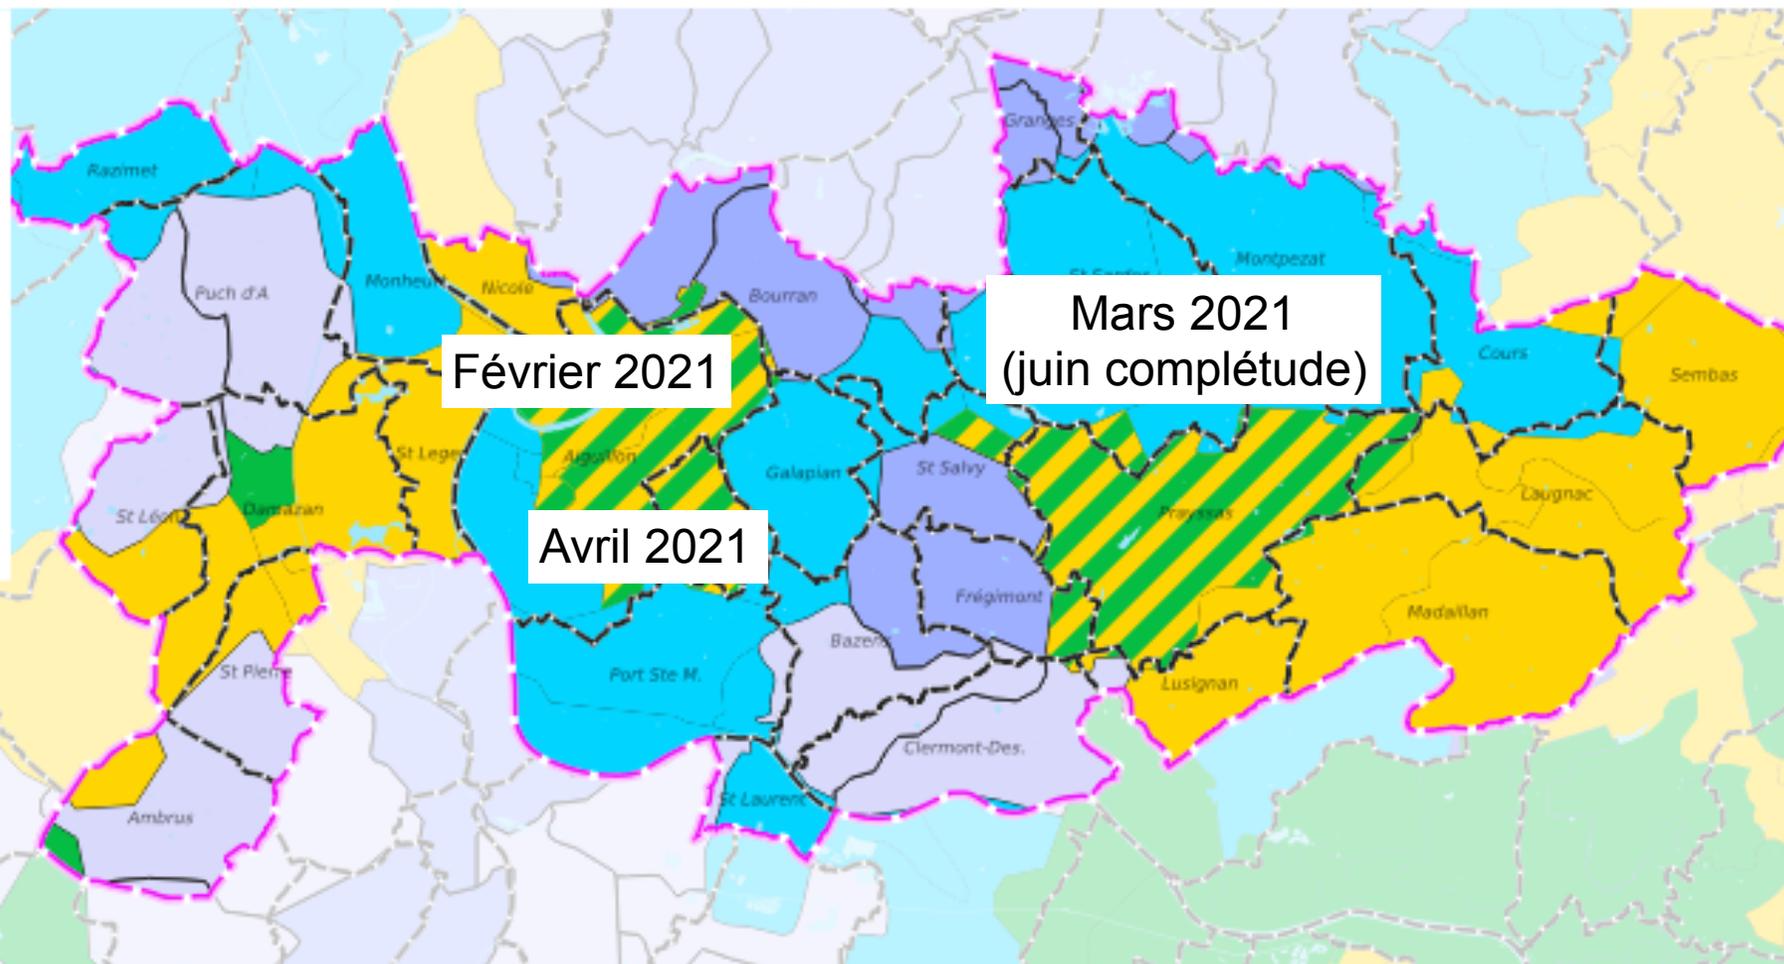

Les solutions d'attente

Dans l'attente du déploiement de la fibre chaque problème a une solution

- **ADSL**
- **Wifi HD**
- **4G Fixe**
- **Satellite**
- **Fibre FTTO pour les entreprises**

Contactez les services du Syndicat Lot-et-Garonne Numérique ou du Département

Le site maconnexioninternet.arcep.fr offre une carte des solutions disponibles

New deal Mobile

Dans le cadre du New Deal Mobile

Une amélioration rapide de la couverture 4G

